



Postbus 349
8440 AH Heerenveen

T 0513 - 653 318
F 0513 - 683 656

E laboratorium@findbedrijven.nl
I www.findbedrijven.nl

Rabobank
KvK Leeuwarden 54462851

5.1.2e

Inspecties & Analyses B.V.

Environmental Consultancy

OFFICIEEL CERTIFICAAT

Slopen&Saneren

5.1.2e

Scharren 16
8517 HN Scharsterbrug

VISUELE EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

Doel van het onderzoek

De visuele eindcontrole heeft plaatsgevonden na het verwijderen van asbesthoudende materialen binnen- en/of buitensituatie. Het onderzoek had tot een doel vast te stellen of er nog visueel waarneembare restanten van het verwijderde asbesthoudende materiaal aanwezig waren. Find Inspecties & Analyses is voor deze verrichting RVA-inspectie geaccrediteerd onder nummer I-224.

Algemene gegevens	Opdrachtgever / eigenaar		Rijksvastgoedbedrijf Directie Transaties en Projecten			
	Asbestverwijderingsbedrijf		Slopen&Saneren			
	DTA-er		5.1.2e			
	Referentienummer werkplan		2019-1456			
	Inventarisatiebedrijf	Rapportnummer	Prinas	PR-19-1421-4		
	Gemeente	Sloopvergunning	Westerwolde	Z2019-00011286		
	Adres locatie bouwwerk / object		Oosteinde 44 te Blijham			
	Saneringmethodiek	Risicoklasse	Buitensanering		Risicoklasse 2 sanering	
	Relatieve vochtigheid (RV)	Omringende RV	53 %	53 %	Verschil RV < 10 %	Ja
	Geïnspecteerde ruimte(n)		Kantoor			
	Verwijderd materiaal (objecten / bronnen) inclusief monstercodering conform inventarisatierapport					
	Vlakke plaat (Bron M11)		Gaskachel (Bron R2/13)			
	Asbestsoorten en gewichtspercenten					
	CHR. 2-5%		CHR.			
	Hechtgebondenheid					
	Hechtgebonden		Niet hechtgebonden			
Nemen van bodemonmonster(s) noodzakelijk voor een totale vrijgave (niet-hechtgebonden bronnen)						
NEN 5707	Niet	NEN 5707		NEN 5707		

Interne gegevens	Datum eindcontrole		19-05-2020	
	Aantal pagina's		4 (inc. deze pagina en situatieschets met foto's als bijlage)	
	Datum rapportage		19-05-2020	
	Certificaat		Gecontroleerd certificaat	
	Projectnummer Find Inspecties & Analyses		P2020-0963	
	Naam laborant		5.1.2e	
	Aankomsttijd	Vertrektijd	13:15	14:15
	Inspectietijd		13:15 tot 13:35	
	Norm		conform NEN 2990 (eindcontrole na asbestverwijdering)	

Let op: Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Find Inspecties & Analyses. Enkel aan het officiële certificaat kunnen rechten worden verleend.

Autorisatie	5.1.2e
	Laborant

P2020-0963 VI Slopen&Saneren, Oosteinde 44 te Blijham,
F202 Rapport Visuele Inspectie, versie 21-09-2018, Pagina 1 van 4



VISUELE EINDCONTROLE

Asbesthoudende toepassingen/materialen conform werkplan, inventarisatierapport + mededelingen DTA'er

Nr.	Locatie/object/bodem	Verwijderd materiaal	Asbestsoorten en hechtgebondenheid
1	Kantoor	Vlakke plaat (Bron M11)	CHR. 2-5% / Hechtgebonden
2	"	Gaskachel (Bron R2/13)	CHR. / Niet hechtgebonden
3			/
Indien buitensanering, totaal aantal m ² (vierkante meters) afgeschermd			200 m ²

Inspectie I binnen- en buitensanering (randvoorwaarden)

	Bevindingen	Opmerkingen
Is elke plek in het werkgebied goed verlicht?	Wel	Geen
Zijn losstaande producten in werkgebied aanwezig?	Wel	Aanhanger met verpakt asbest
Zijn de ruimten of objecten in het werkgebied gemakkelijk te bereiken?	Wel	Geen

Inspectie II buitensanering (randvoorwaarden)

Locatie/object/bodem	Omschrijving klimaat Zon/zware regen/motregen/sneeuw/vorst/schemer	Opmerkingen
Kantoor	Bewolkt	Geen
"	Bewolkt	Geen

Inspectie III binnen- en buitensanering (bouw- en constructiedelen waar asbesthoudende delen gemonteerd waren)

Inspectie in binnen- en buitensanering (bouw- en constructiedelen waar asbesthoudende delen gemonteerd waren)								
Nr.	Locatie/object/ bodem	Resultaat Constructie deel		Resultaat Aangelegen delen		Resultaat Ondergelegen oppervlak		Opmerkingen en/of beperkingen
1	Kantoor	+		+		+		Visuele Inspectie: Betreft het saneren van ca. 5m2 vlakke plaat en 1 gaskachel uit het kantoor van pand 44 aan de Oosteinde te Blijham. - Primaire voorwaarden: Werkplan, asbestinventarisatierapport, sloopmelding zijn op locatie aanwezig. - Bevindingen: Werkgebied is afgezet met linten en is in orde bevonden. Bron 11 is door HVK 5.1.2a, rapport nummer A-20190148, terug geschaald naar een buitensituatie. - Beperkingen en/of uitsluitingen: Van maaiveld is slechts de toplaag inspecteerbaar. Tussen naden, kieren en gaten van de constructiedelen en begroeiing is slechts een beperkte inspectie mogelijk. Vuile ruimte deco is schoon en leeg.
2	"	+		+		+		
3								
Locatie/object/bodem		1	Resultaat	2	Resultaat	3	Resultaat	
Daken en nok								
Dakgoten								
Begroeiing en struiken		Ja	+	Ja	+			
Bomen								
Plassen (regen)								
Sloot en vijver								
Grind								
Gras		Ja	+	Ja	+			
Zand								
Aarde		Ja	+	Ja	+			
Inventaris								
Andere asbestbronnen aanwezig:								
Overige: Bestrating		Ja	+	Ja	+			
Overige: Vloer		Ja	+	Ja	+			
Overige:								
Overige:								

Verklaring symbolen:

+ = direct in orde bevonden
 +(2) = in orde bevonden na een aanvullende schoonmaak
 A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestverdachte resten; gehele locatie moet opnieuw gereinigd worden

*Bij controle van buitensanering dient de kolom "overige" te worden gedetailleerd met voor de betreffende locatie specifieke inspectiepunten.

Conclusie

Op grond van de resultaten van de visuele eindcontrole en eventueel het beschreven onderzoek mag de onderzochte ruimte **WEL** zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen worden betreden.



BIJLAGE SITUATIESCHETS

Opdrachtgever:	Slopen&Saneren
Laborant:	5.1.2e
Projectnummer opdrachtgever:	2019-1456
Projectnummer Find Inspecties & Analyses:	P2020-0963
Adres inspectie:	Oosteinde 44
Plaats inspectie:	Blijham
Datum:	19-05-2020
Onderzocht gebied/ruimte(n):	Kantoor

Postbus 349

T 0513 - 653 318

E laboratorium@findbedrijven.nl

Rabobank


5.1.2e

8440 AH Heerenveen

F 0513 - 683 656

I www.findbedrijven.nl

KvK Leeuwarden 54462851

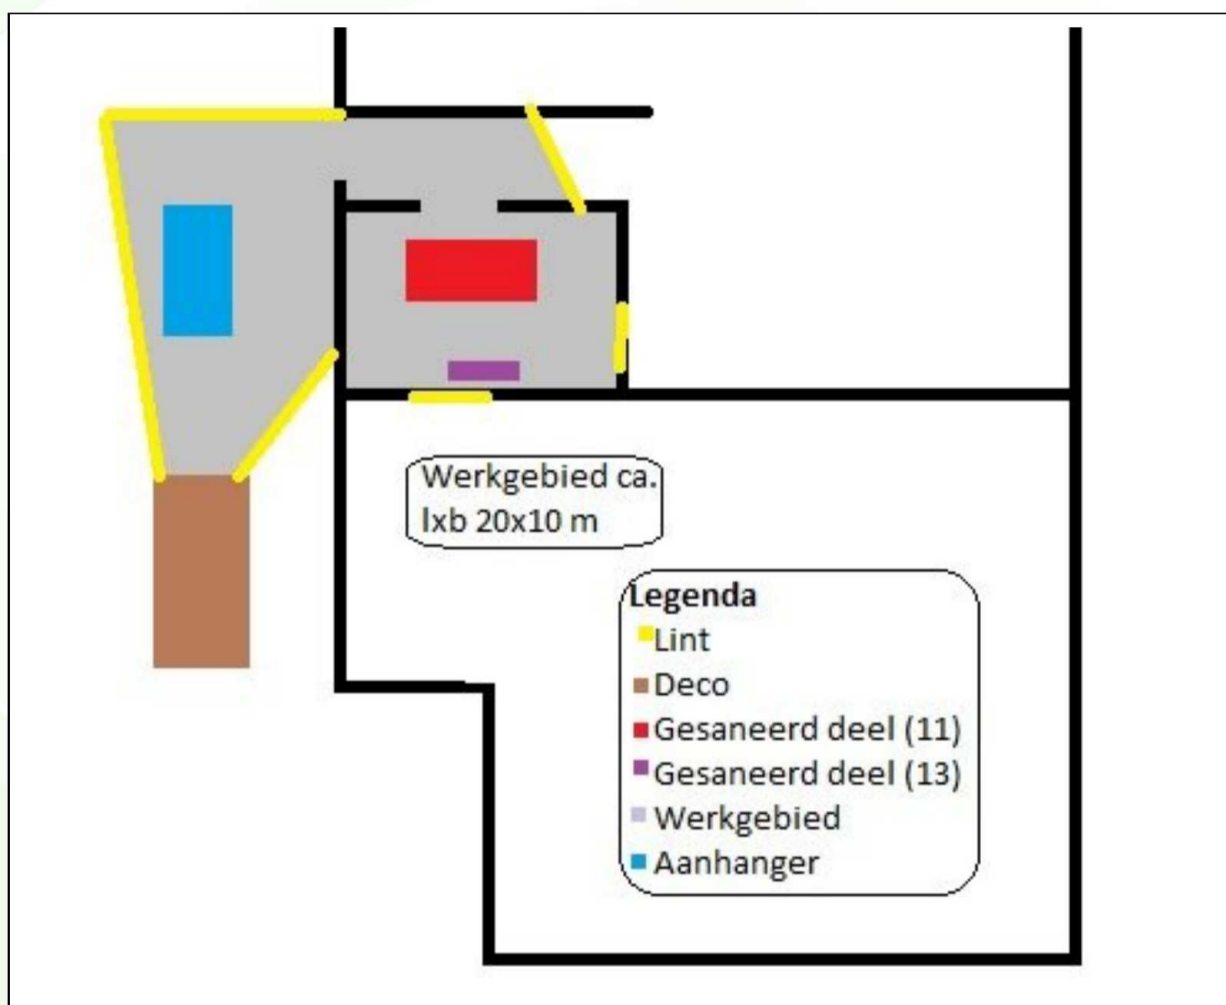

Situatieschets visuele eindcontrole



Find Bedrijven



Inspecties & Analyses
Environmental Consultancy



Asbestinventarisatie
Milieukundig Adviesbureau



FOTOFORMULIER PROJECTLOCATIE

		
Foto 1: Vooraanzicht	Foto 2: Deco	Foto 3: Gesaneerd deel, bron 11
		
Foto 4: Gesaneerd deel, bron 11	Foto 5: Gesaneerd deel, bron 13	Foto 6: Werkgebied
		
Foto 7: Werkgebied	Foto 8: Aanhanger met verpakt asbest	Foto 9: Werkgebied
		
Foto 10: Werkgebied	Foto 11: Werkgebied	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1 2 3
